

PLAN DE TRABAJO 2026–2027

Actividades por mes, hitos y línea de tiempo del proceso, ajustados al envío del Informe de Autoevaluación en julio de 2027

Inicio: 3 sep 2026

Envío a la CNA: 26 jul 2027



PUNTO DE PARTIDA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3 SEP 2026

Hito de inicio realizado con el Consejo Académico.

Alcance acotado: no alcanzó a la comunidad ni a los cuerpos colegiados.

26 JUL 2027

Envío del Informe de Autoevaluación a la CNA.

Límite interno: 30 de julio. El plazo reglamentario se abre el 25 de abril.

8–12 NOV 2027

Visita de pares evaluadores, a solicitar.

La CNA la fija entre el 6 de septiembre y el 1 de diciembre de 2027.

SEPTIEMBRE 2026

Estado al 24 de septiembre y tareas de la semana del 28

● ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO

- jue 3

Hito de inicio con el Consejo Académico (alcance acotado) · **realizado**
- 28 sep – 2 oct

Carta del Rector a la comunidad; micrositio y correo del proceso
- 28 sep – 2 oct

Solicitud formal de antecedentes faltantes a vicerrectorías
- 28 sep – 2 oct

Material de trabajo a repositorio institucional con acceso controlado
- 28 sep – 9 oct

Borrador de resolución rectoral; mesa con Comunicaciones y Medios

● ETAPA PARTICIPATIVA

- desde 14 sep

Preparación de los talleres con consejos: guion, registro y material · **en curso**
- desde 7 sep

Ajuste de los cuestionarios de la Consulta a Informantes Clave · **en curso**

● DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA ANTERIOR

- desde 7 sep

Análisis de antecedentes institucionales y nudos críticos · **en curso**
- desde 10 sep

Matriz de seguimiento del Plan de Mejora anterior · **en curso**
- 28 sep – 16 oct

Entrevistas a autoridades unipersonales y decanatos
- 28 sep – 23 oct

Manual de indicadores y requerimiento de datos

HITOS DEL MES

3
SEP

Hito de inicio con el Consejo Académico

REALIZADO

28
SEP

Carta del Rector: el inicio del proceso llega a toda la comunidad

OCTUBRE 2026

Talleres con consejos, resolución del proceso y Comisiones por Dimensión

● ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO

- jue 1 Jornada con vicerrectorías y direcciones: presentación del proceso
- 5 – 16 Secretaría General: órgano que aprueba el Informe y sesiones de 2027
- 5 – 16 Contrapartes por facultad y por el Programa de Bachillerato
- vie 16 Resolución rectoral del proceso; primera sesión del Comité Directivo
- vie 23 Comisiones por Dimensión y equipos de apoyo, por resolución
- desde 19 Presentación del proceso al Consejo Universitario y al Consejo Superior
- desde 26 Talleres de entrenamiento para comisiones y equipos de apoyo

● ETAPA PARTICIPATIVA

- desde lun 5 Talleres con consejos de facultad y de departamento (más de 50)
- desde 19 Sistematización de los talleres por unidad y por criterio

● DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA ANTERIOR

- vie 23 Matriz de seguimiento del Plan de Mejora anterior; nudos críticos
- 26 – 30 Carta del Rector a las unidades con compromisos del ciclo anterior

● COMISIONES POR DIMENSIÓN

- desde 26 Propuestas referenciales de posicionamiento por estándar

HITOS DEL MES

5
OCT

Comienzan los talleres con consejos de facultad y de departamento

16
OCT

Resolución rectoral del proceso y Comité Directivo instalado

23
OCT

Comisiones constituidas; matriz de seguimiento del Plan de Mejora anterior

30
OCT

Término de los talleres, según calendario de la DDIAC

NOVIEMBRE 2026

Comisiones en sesión y apertura de la etapa participativa con la comunidad

● COMISIONES POR DIMENSIÓN

lun 9 Primera sesión de las cinco Comisiones; posicionamientos niveles 1 y 2
desde 23 Revisión crítica externa de los posicionamientos de niveles 1 y 2

● ETAPA PARTICIPATIVA

5 – 13 Validación por panel y aplicación piloto de los cuestionarios
lun 16 Consulta a Informantes Clave (a 18 dic)
desde 16 Talleres con funcionarios, asociaciones gremiales y estudiantes
desde 16 Fichas de autoevaluación por facultad y Programa de Bachillerato

● ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO

vie 13 Compromisos de desempeño con horas; plataforma y repositorio
vie 13 Sistematización de talleres

● DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA ANTERIOR

2 – 27 Reportes de las unidades sobre sus compromisos, con evidencia
a 27 Compromisos por dimensión para el Plan de Mejora 2028 (DDIAC)

● MUESTRA INTENCIONADA

16 nov – 4 dic Capacitación a carreras; mecanismos de calidad por foco
desde 30 "Ensayo general" de la muestra con carreras de pregrado

HITOS DEL MES

6
NOV

Propuestas referenciales de posicionamiento; simulación de la muestra

9
NOV

Primera sesión de las Comisiones por Dimensión

13
NOV

Cuestionarios validados; compromisos de desempeño; plataforma

16
NOV

Apertura de la etapa participativa con la comunidad

DICIEMBRE 2026

Verificación del Plan de Mejora anterior y acuerdo sobre el nivel de acreditación

● **DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA ANTERIOR**

- 30 nov – 18 mié 16** Reuniones de verificación con las unidades responsables
- desde 21** Jornada de revisión de avances: logros del Plan de Cierre de Brechas
- desde 21** Evaluación de brechas: debilidades superadas, con avances y no superadas

● **COMISIONES POR DIMENSIÓN**

- vie 11** Posicionamientos de niveles 1 y 2 concluidos
- desde 14** Posicionamientos de nivel 3 (a 22 de enero)
- jue 17** Primera jornada de revisión de avances con el Rector

● **ETAPA PARTICIPATIVA**

- vie 11** Término de los talleres con estudiantes
- vie 18** Cierre de la primera aplicación de la Consulta (sin reapertura)
- desde 21** Procesamiento y reporte por estamento y dimensión

● **ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO**

- vie 18** Comité Directivo: nivel al que se opta y dimensiones que se presentan
- diciembre** Reglamento del Consejo Institucional de la Calidad aprobado
- 28 – 31** Semana de actividad reducida

● **MUESTRA INTENCIONADA**

- vie 4** Mecanismos de aseguramiento de la calidad por foco definidos

HITOS DEL MES

4
DIC

Mecanismos por foco definidos para la muestra

16
DIC

Jornada de revisión de avances del Plan de Mejora anterior

18
DIC

Acuerdo sobre nivel y dimensiones; cierre de la primera aplicación

ENERO Y FEBRERO 2027

Término del diagnóstico antes del receso universitario de verano

● **DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA ANTERIOR**

- 4 – 22 ene Informe de cumplimiento del Plan de Mejora anterior
- 11 – 22 ene Rendición de cuentas a los cuerpos colegiados: diagnóstico y nivel

● **COMISIONES POR DIMENSIÓN**

- a 22 ene Posicionamientos de nivel 3
- 11 ene – 12 feb Revisión crítica externa de nivel 3 (continúa en el receso)

● **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028**

- 4 – 22 ene Estructura y orientaciones para la redacción: índice y pauta
- vie 22 ene Ficha Institucional de Datos, primera versión con registro de vacíos

● **ETAPA PARTICIPATIVA**

- a 22 ene Reporte de la primera aplicación de la Consulta

● **MUESTRA INTENCIONADA**

- a 22 ene Término del "ensayo general" con carreras de pregrado

● **RECESO**

- 25 ene – 26 feb Receso universitario de verano: sin actividades institucionales

HITOS DEL MES

22

ENE

Término del diagnóstico: balance del Plan de Mejora anterior, nivel 3, Ficha e índice

25

ENE

Inicio del receso universitario de verano (hasta el 26 de febrero)

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO: FUENTES

Es el proceso en que cada Comisión por Dimensión, con su equipo de apoyo, construye los posicionamientos que sustentan el capítulo respectivo del Informe de Autoevaluación.

PRODUCTOS DE CADA COMISIÓN

- 1

Posicionamientos por estándar

niveles 1 y 2: 11 dic · nivel 3: 22 ene · completos: 19 mar
- 2

Hallazgos principales y matriz de brechas

9 abr
- 3

Informe por dimensión: fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar

9 abr



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO: **CONDICIONES**

El trabajo de las Comisiones por Dimensión debe cumplir tres condiciones:

1

Homogéneo en su forma

Todas las comisiones usan la misma pauta, el mismo registro y la misma escala de valoración.

2

Referido a los estándares

Da cuenta del nivel de logro de la Universidad en cada estándar de los niveles 1, 2 y 3 de los criterios CNA (2023).

3

Basado en posicionamientos

Cada comisión parte de propuestas referenciales por estándar, que puede y debe replantear con evidencia.

EL CONJUNTO DE POSICIONAMIENTOS ES LA BASE DE LA REDACCIÓN DEL INFORME

**Propuestas
referenciales**
6 nov 2026

Niveles 1 y 2
9 nov – 11 dic

Nivel 3
14 dic – 22 ene

**Posicionamientos
completos**
19 mar 2027

**Informes por
dimensión**
9 abr

**Capítulos
redactados**
7 may

POSICIONAMIENTO: CÓMO SE CONSTRUYE

1

Respaldable

Cada proceso o resultado que se afirma debe poder demostrarse con evidencia verificable.

2

Consistente

La valoración corresponde a lo que muestran los datos, no a lo que la política declara.

3

Con trayectoria

Se reconstruye el ciclo de mejora de un proceso o iniciativa, con su situación antes y después.

4

Del período

Se privilegian los resultados obtenidos desde 2021, inicio del período de acreditación vigente.

El posicionamiento es producto de juicios, reflexiones y observaciones objetivas de la comisión.

TRES PLANOS QUE SE DISTINGUEN

DECLARADO

Política, reglamento, discurso institucional



IMPLEMENTADO

Práctica efectiva, cobertura y sistematicidad



VERIFICABLE

Datos, series de tiempo, actas y registros

Un posicionamiento sostenido solo en lo declarado no alcanza el nivel 2.

POSICIONAMIENTO: EJEMPLO

ESTÁNDAR · CRITERIO 2, NIVEL 2

“La universidad define y evalúa periódicamente indicadores de progresión de las y los estudiantes y el nivel de logro del perfil de egreso.”

POSICIONAMIENTO ILUSTRATIVO

“La Universidad cuenta con [mecanismo institucional de seguimiento], que monitorea [cada semestre] la retención, la aprobación y la titulación oportuna por carrera y cohorte, y evalúa el logro del perfil de egreso mediante [instrumento]. Con esa información, la Vicerrectoría Académica y las facultades despliegan [estrategias de apoyo académico] dirigidas a estudiantes en riesgo de deserción. El mecanismo es coordinado por [instancia responsable], que revisa [anualmente] los resultados y ajusta las estrategias. Entre [2021] y [2025], la retención de primer año pasó de [x] % a [y] %, [bajo / sobre] la meta de [z] % del PDEI; la brecha se aborda en la acción [n] del Plan de Mejora 2028.”

Los corchetes se completan con datos verificados. Un posicionamiento incluye el resultado obtenido y la brecha que persiste, no solo la existencia del mecanismo.

POSICIONAMIENTO: QUÉ DEBE RESPALDARSE

Cada componente del posicionamiento del ejemplo requiere un medio de verificación:

	Componente del posicionamiento	Medio de verificación	Plano
1	Existencia del mecanismo y de sus responsables	Resolución o documento que lo crea y asigna funciones	Declarado
2	Indicadores monitoreados por carrera y cohorte	Series de al menos tres años en la Ficha Institucional de Datos	Verificable
3	Estrategias de apoyo desplegadas	Registros de cobertura: estudiantes atendidos por programa y facultad	Implementado
4	Instancia que coordina y revisa los resultados	Actas con acuerdos y periodicidad efectiva de las sesiones	Implementado
5	Ajustes realizados a partir de la revisión	Decisiones documentadas y nuevas versiones del mecanismo	Verificable
6	Resultado y brecha respecto de la meta	Comparación con las metas del PDEI y acción del Plan de Mejora	Verificable

Si falta la evidencia de un componente, el posicionamiento se reformula o la brecha se declara.

¡ATENCIÓN!: ¿CÓMO ES UNA BUENA AUTOEVALUACIÓN?

1

NO SE EVALÚA POR LA RETÓRICA

Una autoevaluación no se juzga por el desempeño que reporta ni por la forma en que lo relata.

2

SE EVALÚA POR LA EVIDENCIA

Se juzga por la objetividad y la calidad de la evidencia con que presenta y analiza la realidad de la Universidad.

3

PERMITE UN JUICIO EXTERNO

Es buena si, a partir de ella, los pares evaluadores pueden formarse un juicio objetivo sobre la realidad y la proyección institucional.

4

DECLARA LO QUE FALTA

Las debilidades y los compromisos no cumplidos se declaran, se explican y se vinculan a una acción del Plan de Mejora.

PROCESOS Y INFORMACIÓN HABILITANTE PARA LA AUTOEVALUACIÓN (1/2)

	Proceso o información habilitante	Criterios CNA asociados (nivel)
a	Definición de los programas de vinculación con el medio, formalizados por los órganos colegiados que corresponda.	● C11 · Política y gestión de la vinculación con el medio (N1–N2) ● C12 · Resultados e impacto de la vinculación con el medio (N1)
b	Plan iniciado de implementación o de ajuste de los instrumentos y procesos de calificación académica.	● C6 · Gestión y desarrollo de personas (N2) ● C3 · Cuerpo académico (N1–N2)
c	Planes remediales de los proyectos MINEDUC sometidos a evaluación del MINEDUC, y plan en curso de reestructuración de la gobernanza de esos instrumentos.	● C8 · Gestión de recursos (N1–N2) ● C5 · Gobierno y estructura organizacional (N3) ● C9 · Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad (N1)
d	Ficha de datos institucionales actualizada, con un protocolo de actualización definido y acordado.	● C8 · Gestión de recursos (N2) ● C9 · Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad (N1–N2) ○ <i>Ficha Institucional de Datos: Res. Ex. DJ N°343-4, art. 5</i>
e	Responsables de la escritura de cada capítulo del Informe, y contrapartes designadas en las unidades con que interactuarán.	◆ Todos los criterios: un responsable por capítulo ● C9 · Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad (N2)
f	Socialización del proceso de redacción del Informe con las autoridades universitarias.	● C9 · Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad (N2–N3) ○ <i>Proceso participativo: Res. Ex. DJ N°343-4, art. 3</i>
g	Actualización de las cifras relevantes (tablas y gráficos) del Informe del proceso anterior (acreditación 2021).	◆ Todos los criterios: series de al menos tres años

PROCESOS Y INFORMACIÓN HABILITANTE PARA LA AUTOEVALUACIÓN (2/2)

	Proceso o información habilitante	Criterios CNA asociados (nivel)
h	Conjunto definido de empleadores, egresados y beneficiarios de la vinculación con el medio con quienes mantener un vínculo regular.	● C11 · Política y gestión de la vinculación con el medio (N1) ● C12 · Resultados e impacto de la vinculación con el medio (N2) ● C1 · Modelo educativo y diseño curricular (N3)
i	Línea estética y gráfica del material del proceso, incluido el Informe.	– Sin criterio directo: identidad y comunicación del proceso
j	Comunicación formal con la Secretaría Ejecutiva de la CNA sobre los plazos y el plan de trabajo del proceso.	○ Res. Ex. DJ N°343-4, arts. 2, 5, 14 y 15 (plazo, recesos y fecha de visita)
k	Cumplimiento del plan de acreditación de las Especialidades Médicas.	● C10 · Aseguramiento de la calidad de los programas formativos (N1–N2)
l	Procesos y situaciones que puedan exponer públicamente a la institución, con estrategias de mitigación y de reacción comunicacional.	● C5 · Gobierno y estructura organizacional (N1) ● C7 · Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión (N2)
m	Tres proyectos de innovación en gestión administrativa (en curso o por iniciar), con implementación reforzada y resultados caracterizados.	● C5 · Gobierno y estructura organizacional (N3) ● C8 · Gestión de recursos (N2) ● C9 · Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad (N3)

MARZO 2027

Retorno del receso: comienza la redacción del Informe de Autoevaluación

● **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028**

- 1 – 5
- Talleres de entrenamiento para redactores; asignación de capítulos
- desde 1
- Redacción de capítulos por criterio (a 7 de mayo)

● **COMISIONES POR DIMENSIÓN**

- 1 – 19
- Cierre de posicionamientos pendientes
- desde 1
- Hallazgos principales y matriz de brechas por criterio
- desde 22
- Informes por dimensión

● **ETAPA PARTICIPATIVA**

- desde 8
- Segunda aplicación a estudiantes; egresados, empleadores y socios
- vie 19
- Fichas de autoevaluación de facultades y Programa de Bachillerato
- desde 29
- Talleres con estudiantes, egresados, empleadores y socios

● **ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO**

- vie 19
- Constitución del Consejo Institucional de la Calidad
- 1 – 19
- Definición frente al riesgo financiero (gratuidad y sobreduración)

● **MUESTRA INTENCIONADA**

- 1 – 19
- "Ensayo general" con postgrado y especialidades médicas

HITOS DEL MES

1

MAR

Retorno del receso e inicio de la redacción del Informe

19

MAR

Posicionamientos completos; Consejo Institucional de la Calidad constituido

ABRIL 2027

Informes por dimensión y Plan de Mejora 2028

● COMISIONES POR DIMENSIÓN

- vie 9** Informes por dimensión y matriz de brechas
- mié 21** Segunda jornada de revisión de avances con el Rector

● ETAPA PARTICIPATIVA

- vie 9** Término de la Consulta a Informantes Clave
- a 16** Talleres con estudiantes, egresados, empleadores y socios
- mié 14** Jornada de reflexión académica
- 12 – 30** Informe consolidado de encuestas y talleres

● INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028

- desde 12** Plan de Mejora 2028: siete campos por acción, costeados
- desde 26** Integración de resultados en los capítulos
- vie 30** Corte de información para la Ficha Institucional de Datos

● MUESTRA INTENCIONADA

- desde 5** Planes de cierre de brechas documentales por carrera y programa

● PROCESO ANTE LA CNA

- dom 25** Se abre el plazo para presentar el Informe (diez meses antes)

HITOS DEL MES

9
ABR

Informes por dimensión y matriz de brechas; término de la Consulta

25
ABR

Se abre el plazo reglamentario para presentar el Informe

30
ABR

Informe consolidado de la Consulta a Informantes Clave

MAYO 2027

Capítulos redactados y primer borrador del Informe

● INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028

- vie 7

Capítulos redactados; Plan de Mejora 2028 coherente con el PDEI
- 10 – 27

Síntesis evaluativa por criterio y capítulos generales
- desde 17

Ficha Institucional de Datos definitiva y anexos (a 2 de julio)
- vie 28

Primer borrador del Informe de Autoevaluación

● ETAPA PARTICIPATIVA

- 3 – 7

Resultados de la Consulta presentados a las Comisiones
- mié 12

Presentación del avance del proceso a la comunidad

● ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO

- 17 – 28

Rendición de cuentas semestral a los cuerpos colegiados

● MUESTRA INTENCIONADA

- vie 7

Planes de cierre de brechas documentales concluidos
- desde 31

Constitución y entrenamiento del equipo de muestra

Viernes 21 de mayo: feriado.



HITOS DEL MES

7

MAY

Plan de Mejora 2028 costeadado y capítulos redactados

28

MAY

Primer borrador del Informe de Autoevaluación

JUNIO 2027

Revisión del borrador por actores clave internos y externos

● **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028**

- 31 may – 11** Revisión por actores clave y primera revisión con mirada de par
- 14 – 18** Incorporación de observaciones
- 22 jun – 2 jul** Segunda revisión con mirada de par; consistencia informe–anexos
- desde 29** Validación de la versión final; edición y diagramación

● **ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO**

- 14 – 25** Consultas formales a la Secretaría Ejecutiva de la CNA
- vie 18** Comité Directivo: carrera de elección voluntaria y días de visita

● **MUESTRA INTENCIONADA**

- a 25** Equipo de muestra constituido y entrenado
- desde 14** Capítulo institucional del informe de muestra, preparado con antelación

HITOS DEL MES

11

JUN

Observaciones de actores clave internos y externos recibidas

18

JUN

Acuerdo del Comité Directivo sobre elección voluntaria y visita

Lunes 21 y lunes 28 de junio: feriados.



JULIO 2027

Aprobación colegiada y envío del Informe a la CNA

● INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028

- vie 2

Diagramación del Informe
- a 21

Diagramación del Informe

● ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL PROCESO

- jue 1

Consejo Institucional de la Calidad conoce la versión final
- semana del 5

Aprobación del Informe en el Consejo Universitario
- semana del 12

Aprobación del Informe en el Consejo Superior
- 12 – 15

Solicitud de incorporación: dimensiones, sedes y recesos
- 19 – 23

Semana de resguardo, sin actividades programadas
- lun 26

Envío del Informe, la Ficha y la solicitud a la CNA (límite: vie 30)
- 26 – 30

Comunicación del envío a la comunidad

● MUESTRA INTENCIONADA

- desde 27

Selección de la muestra por la CNA (cinco días hábiles)

● PREPARACIÓN DE LA VISITA DE PARES

- desde 1

Instancias convocadas a la visita, delegaciones y nómina para sorteo

HITOS DEL MES

2

JUL

Versión final validada por el Comité de Autoevaluación

15

JUL

Informe aprobado por el Consejo Universitario y el Consejo Superior

26

JUL

ENVÍO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN A LA CNA

LÍMITE: 30 JUL

Viernes 16 de julio: feriado. Las sesiones deben quedar fuera del receso de invierno 2027.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2027

Muestra intencionada y socialización del Informe

● PROCESO ANTE LA CNA

- a 16 ago Revisión formal de la CNA; subsanación, si hay observaciones
- a 16 ago Compromiso de pago de arancel; sustentabilidad financiera
- desde 6 sep Se abre el plazo reglamentario de la visita (hasta el 1 de diciembre)

● MUESTRA INTENCIONADA

- 3 – 5 ago Observaciones a la selección y elección voluntaria de carrera
- 6 – 12 ago Jornada inicial con carreras y programas seleccionados
- ago – sep Informes de las carreras y programas de la muestra

● SOCIALIZACIÓN

- mié 11 ago Jornada institucional de socialización del Informe y del Plan de Mejora
- 16 ago – 1 oct Jornadas por facultad y estamento; actorías externas

● PREPARACIÓN DE LA VISITA DE PARES

- 2 – 20 ago Programa simulado de la visita
- vie 10 sep Instancias convocadas, delegaciones y nómina para el sorteo
- desde 13 sep Banco de preguntas por audiencia; sala de evidencias

Fechas de la CNA calculadas en días hábiles desde el envío del 26 de julio.

HITOS DEL MES

5

AGO

Pronunciamiento sobre la muestra y elección voluntaria

FECHA ESTIMADA

11

AGO

Jornada institucional de socialización del Informe

10

SEP

Instancias convocadas a la visita y nómina para el sorteo

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2027

Preparación y visita de pares evaluadores

● MUESTRA INTENCIONADA

lun 4 oct Envío del Informe de Muestra Intencionada (60 días corridos)

● PREPARACIÓN DE LA VISITA DE PARES

27 sep – 22 oct Preparación con autoridades, estamentos y carreras

12 – 22 oct Primera ronda de visitas simuladas (asesoría externa)

18 – 22 oct Sesión de preparación de los cuerpos colegiados

vie 22 oct Recepción del programa de visita

25 oct – 5 nov Segunda ronda de visitas simuladas (conducción institucional)

12 oct – 5 nov Actualización de información para los pares; logística

según CNA Sorteo aleatorio de estudiantes y egresados

● PROCESO ANTE LA CNA

8 – 12 nov **Visita de pares evaluadores**

15 – 26 nov Respuesta a requerimientos posteriores a la visita

La fecha de la visita la fija la CNA; si cambia, se desplaza la preparación.



HITOS DEL MES

4
OCT

Envío del Informe de Muestra Intencionada

FECHA ESTIMADA

5
NOV

Visitas simuladas concluidas; información actualizada entregada

8–12
NOV

VISITA DE PARES EVALUADORES

A SOLICITAR

DICIEMBRE 2027 A MARZO 2028

Informe de pares y pronunciamiento de la CNA

● PROCESO ANTE LA CNA

- a 13 dicInforme de evaluación externa del comité de pares
- 14 – 27 dicObservaciones de la Universidad al informe de pares
- 28 dic – 17 enePreparación de la exposición del Rector ante la Comisión
- enero 2028Sesión del Pleno de la CNA y pronunciamiento
- 30 días hábilesNotificación de la resolución (febrero no se computa)
- vie 25 febVencimiento formal de la acreditación vigente, ya prorrogada
- 5 días hábilesRecurso de reposición, si procede

● INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 2028

- marzo 2028Actualización del Plan de Mejora y seguimiento anual

HITOS DEL MES

27

DIC

Observaciones de la Universidad al informe de pares

FECHA ESTIMADA

ENE

2028

Pleno de la CNA y pronunciamiento

LA FIJA LA CNA

La acreditación vigente se prorroga desde el inicio del proceso hasta el nuevo pronunciamiento.



HITOS DEL PROCESO (1/2)

	Fecha	Hito	Responsable
H0	jue 3 sep 2026	Hito de inicio con el Consejo Académico (realizado; alcance acotado)	Rector
H1	vie 16 oct 2026	Resolución rectoral del proceso; Comité Directivo instalado; calendario con envío en julio y presupuesto aprobados	Rector
H2	vie 23 oct 2026	Comisiones por Dimensión constituidas; matriz de seguimiento del Plan de Mejora anterior; manual de indicadores	Director DDIAC
H3	vie 30 oct 2026	Término de los talleres con consejos de facultad y de departamento	Jefatura DAC
H4	vie 6 nov 2026	Propuestas referenciales de posicionamiento; simulación de la muestra	Comité Ejecutivo
H5	vie 13 nov 2026	Cuestionarios validados y pilotados; sistematización de talleres; compromisos de desempeño; plataforma y repositorio	Prorrector · Comité Ejecutivo
H6	lun 16 nov 2026	Apertura de la etapa participativa con la comunidad e inicio de la Consulta a Informantes Clave	Rector
H7	vie 4 dic 2026	Mecanismos de aseguramiento de la calidad por foco definidos (muestra)	Comité Ejecutivo
H8	vie 18 dic 2026	Acuerdo sobre nivel y dimensiones; término de la primera aplicación de encuestas; posicionamientos de niveles 1 y 2	Comité Directivo
H9	vie 22 ene 2027	Término del diagnóstico: informe de cumplimiento del Plan de Mejora anterior; posicionamientos de nivel 3; Ficha v1; índice del Informe	Director DDIAC
H10	vie 19 mar 2027	Posicionamientos completos; "ensayo general" de postgrado; Consejo Institucional de la Calidad constituido	Líderes de dimensión · Secretario General
H11	vie 9 abr 2027	Informes por dimensión y matriz de brechas; término de la Consulta a Informantes Clave	Líderes de dimensión
H12	vie 30 abr 2027	Informe consolidado de la Consulta a Informantes Clave	Comité Ejecutivo


≈ Fecha calculada con los plazos reglamentarios desde el envío o desde la visita; la fija la CNA.

HITOS DEL PROCESO (2/2)

	Fecha	Hito	Responsable
H13	vie 7 may 2027	Plan de Mejora 2028 costeadado; capítulos redactados	Rector · Prorector
H14	vie 28 may 2027	Primer borrador del Informe de Autoevaluación	Director DDIAC
H15	vie 2 jul 2027	Versión final validada por el Comité de Autoevaluación; Ficha definitiva; revisión de consistencia	Director DDIAC
H16	jue 15 jul 2027	Informe aprobado por el Consejo Universitario y el Consejo Superior; solicitud firmada	Rector · Secretario General
H17	lun 26 jul 2027	Envío del Informe de Autoevaluación a la CNA	Rector
H18	≈ jue 5 ago 2027	Pronunciamiento sobre la muestra y elección voluntaria	Secretario General
H19	vie 10 sep 2027	Instancias convocadas a la visita, delegaciones y nómina para el sorteo	Comité Ejecutivo · Secretario General
H20	≈ lun 4 oct 2027	Envío del Informe de Muestra Intencionada	Director DDIAC
H21	≈ vie 5 nov 2027	Visitas simuladas concluidas; actualización de información entregada	Comité Ejecutivo
H22	≈ 8–12 nov 2027	Visita de pares evaluadores	Rector
H23	≈ lun 27 dic 2027	Observaciones de la Universidad al informe de pares	Rector · Director DDIAC
H24	≈ ene 2028	Pleno de la CNA y pronunciamiento (estimado)	Rector

≈ Fecha calculada con los plazos reglamentarios desde el envío o desde la visita; la fija la CNA.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: HITOS

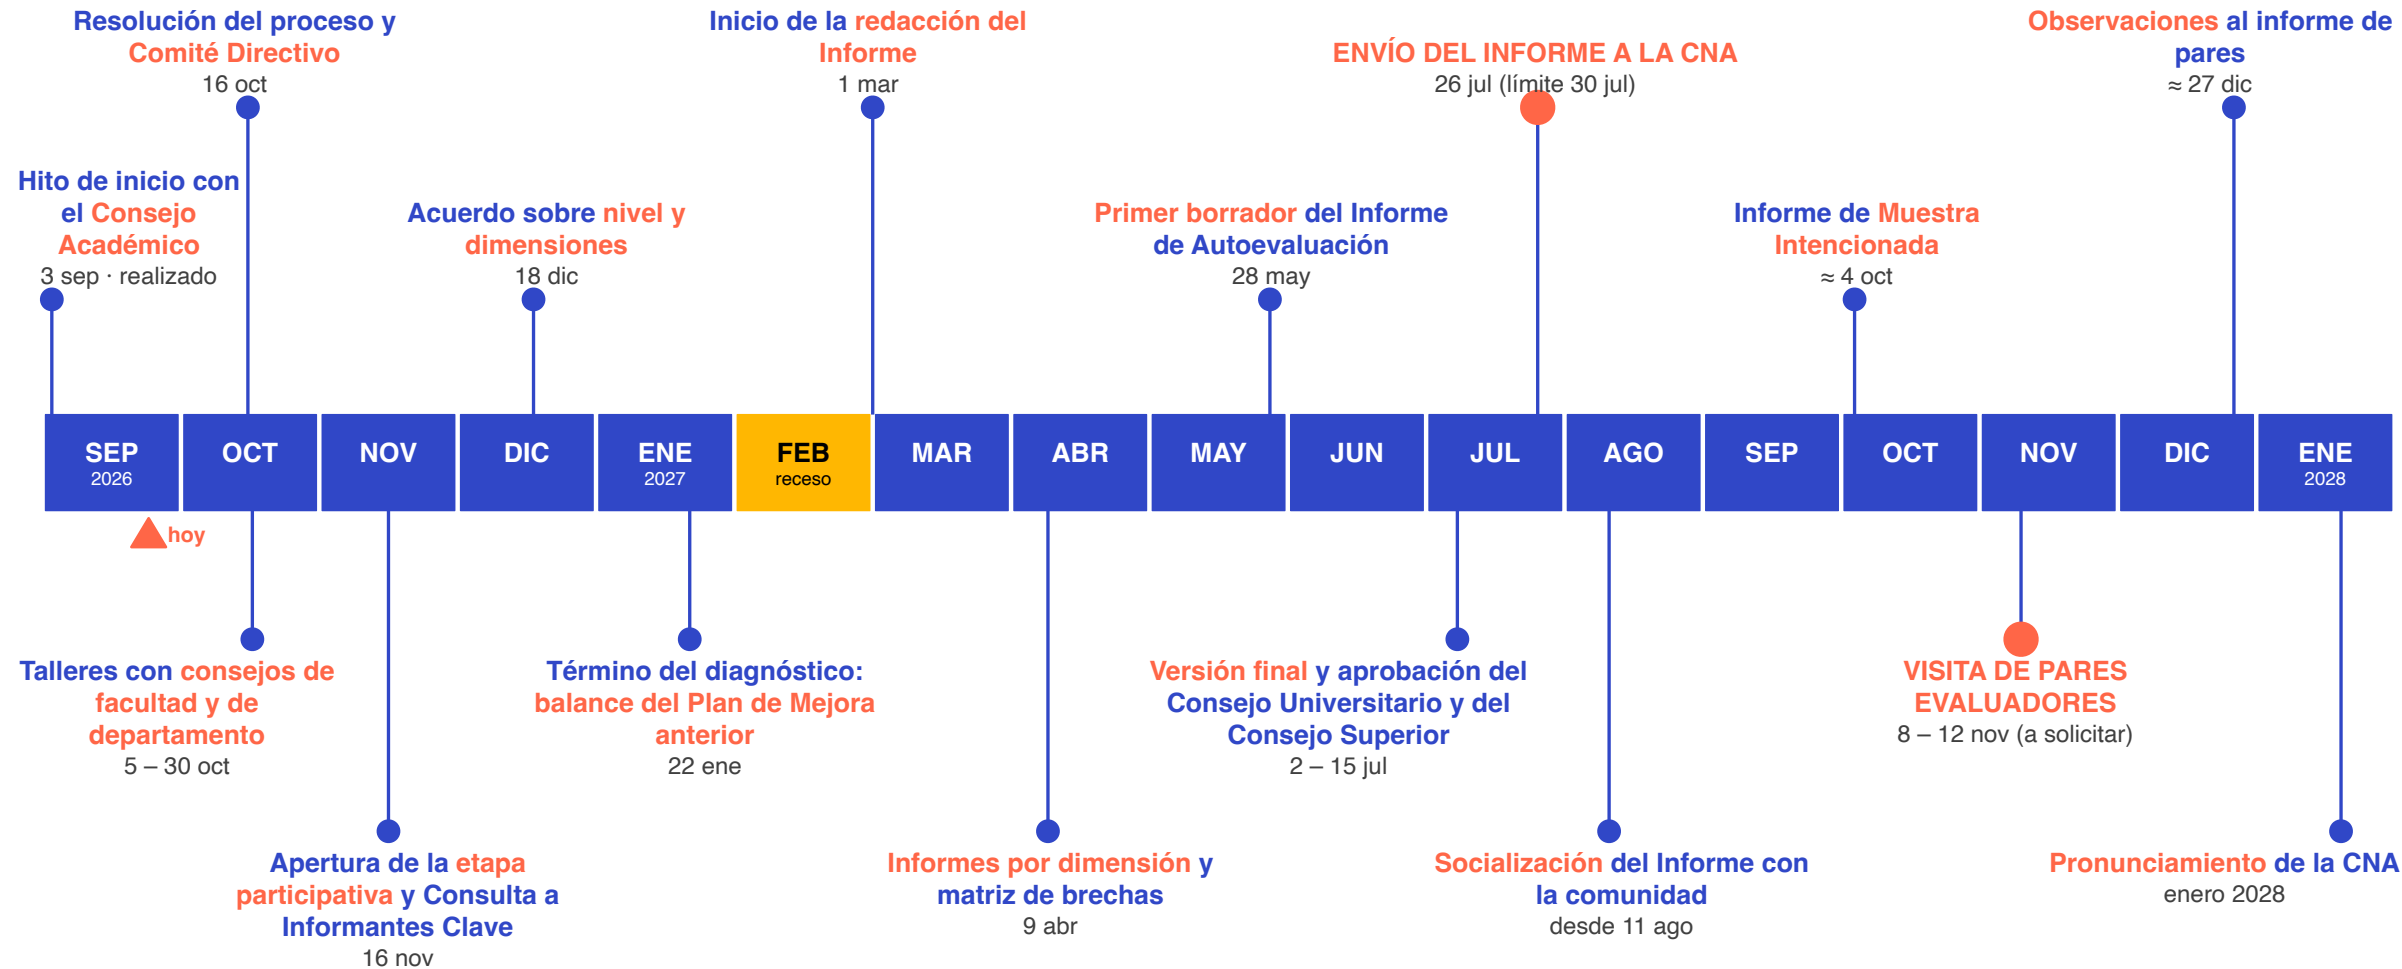

≈ Fechas posteriores al envío calculadas con los plazos reglamentarios; la visita y el pronunciamiento los fija la CNA.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: ETAPAS E HITOS

